La Restauration de L'Eglise Notre-Dame

(dernière tranche, livraison fin 2018)

En préambule, il est bon de rappeler qu'une entreprise agréée pour un certain type de travaux, n'est pas forcément qualifiée MH (Monument Historique). Il semble également utile de préciser que les travaux de l'église avaient toujours été réalisés dans l'urgence (au fur et à mesure des besoins avérés), ce qui ne permet pas toujours la meilleure restauration qui puisse être.
Les derniers travaux en cours, ont été réfléchis et programmés : ils nous ont beaucoup appris sur le béton, qui se comporte comme un matériau vivant alors qu'il n'est aux yeux du grand public qu'une matière inerte (contrairement à la pierre vue comme « vivante »).

Depuis les deux tempêtes de décembre et janvier dernier, la mise hors d'eau a ainsi été LA priorité. Elle se fait ponctuellement en de nombreux endroits, là où la présence d'eau indésirable est apparue. Il arrive qu'il ne soit pas possible de retracer le cheminement inverse des infiltrations d'eau.

Raison pour laquelle il a été décidé de canaliser l'eau introduite

Dans certaines fissures, un produit solidifiant a été injecté, en lieu et place du circuit que prenait l'eau.

Les abords : Les terrasses jouxtant le centre paroissial ont été restaurées, elles ne sont malheureusement pas accessibles au public pour l'instant. La terrasse Sud et la terrasse Nord ont belle allure après leur complète restauration. Tout le garde-corps est neuf, en thermo-laqué blanc. Sur le parvis, l'emmarchement côté Est, a été consolidé à l'aide de barbotine en mortier fibré.

Le lanterneau Sud du baptistère (pyramidion) a été entièrement refait (à l'identique architectural) avec les nouveaux bétons marins.
Auparavant invisibles, on peut y découvrir maintenant des vitraux, comme l'étoile de David, à son sommet.

Les trous de banches étaient « obturés » avec du filet et des bouchons de liège…lors du nettoyage de la façade au jet d'eau, il est probable que le liège ait été endommagé et expulsé par le décapage. D'où les infiltrations d'eau qui n'avaient jamais eu lieu auparavant par ces orifices-là.

Certains travaux ont pu être faits dans le cadre de la garantie décennale :

-Sur les deux tourelles occidentales et porche d'entrée principale : remplacement des joints mastic par des joints silicones et suppression des bavettes en plomb.

-Joints silicones également pour les coursives entre les voiles V10 et V16.

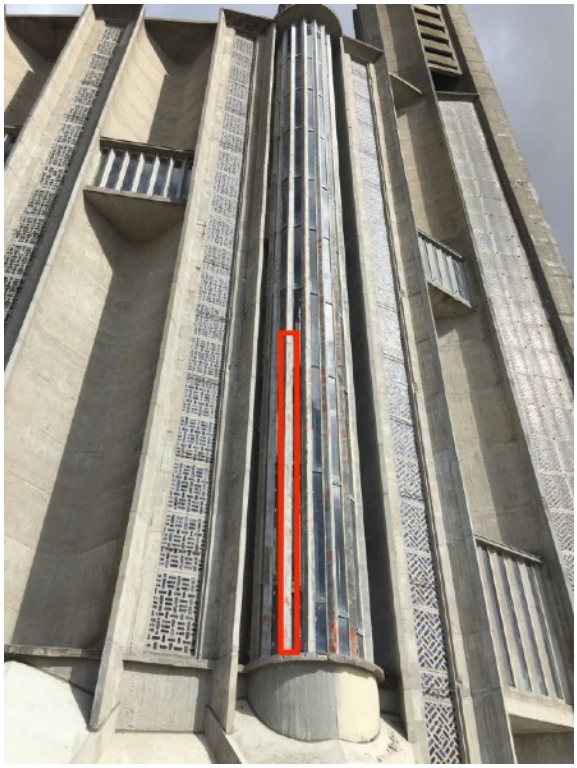

A noter qu'il est prévu, à l'intérieur de l'église, de replacer les vitraux du chemin de croix dans leur ordre d'origine.

La Restauration de l'Orgue

L'orgue comprend maintenant des parties électroniques intégrées. Ces pièces ont aussi été endommagées par les infiltrations d'eau. Les travaux de remontage de l'instrument ont dû être stoppés. Ils reprendront en septembre pour s'achever au printemps 2019.

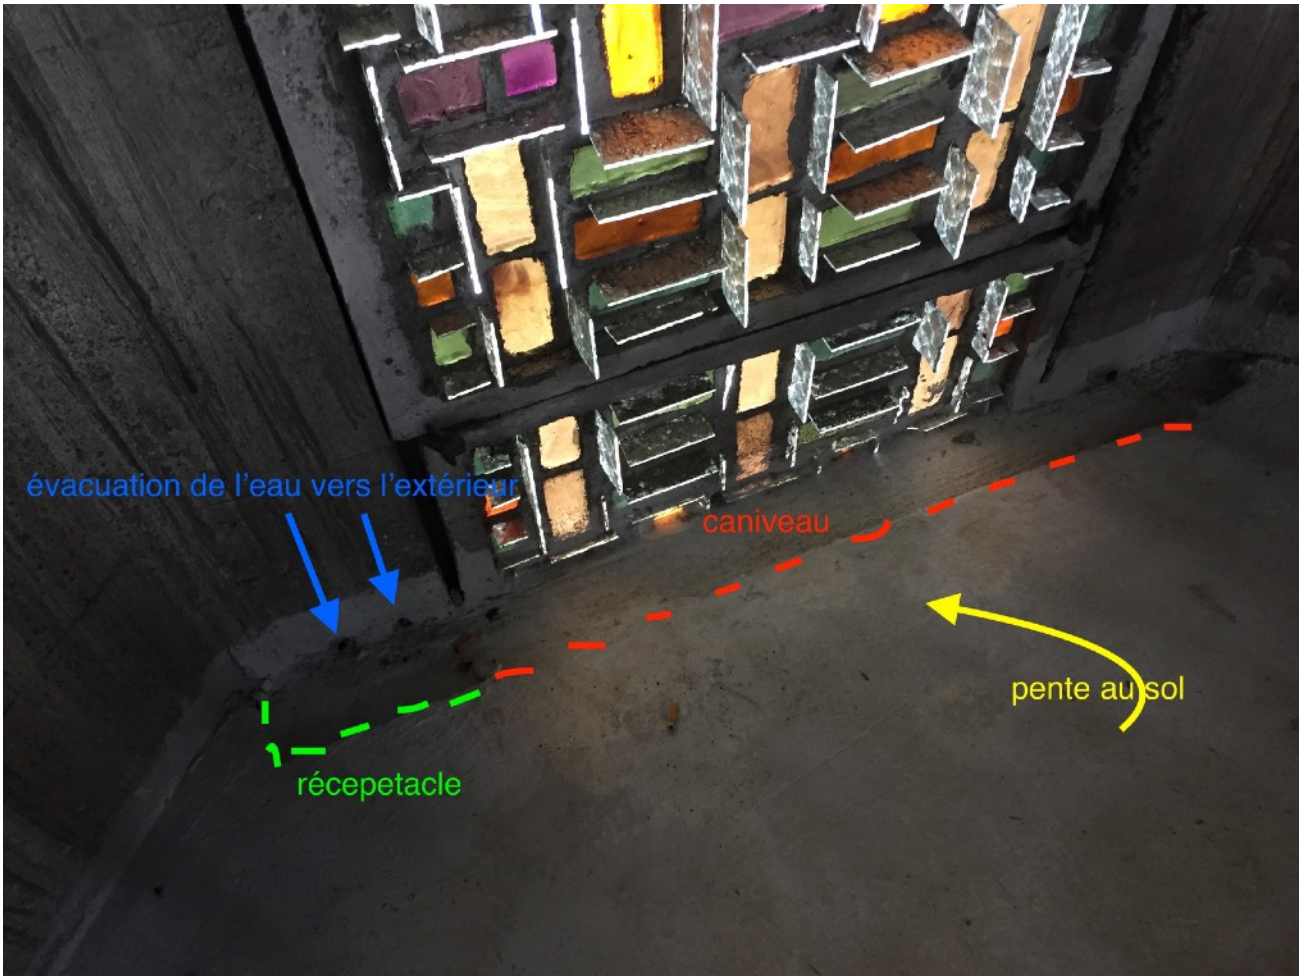

Sol autour de l'orgue avec aménagements d'écoulements de l'eau, en cas de nouvelle « intrusion ».

Le Plan Lumière :

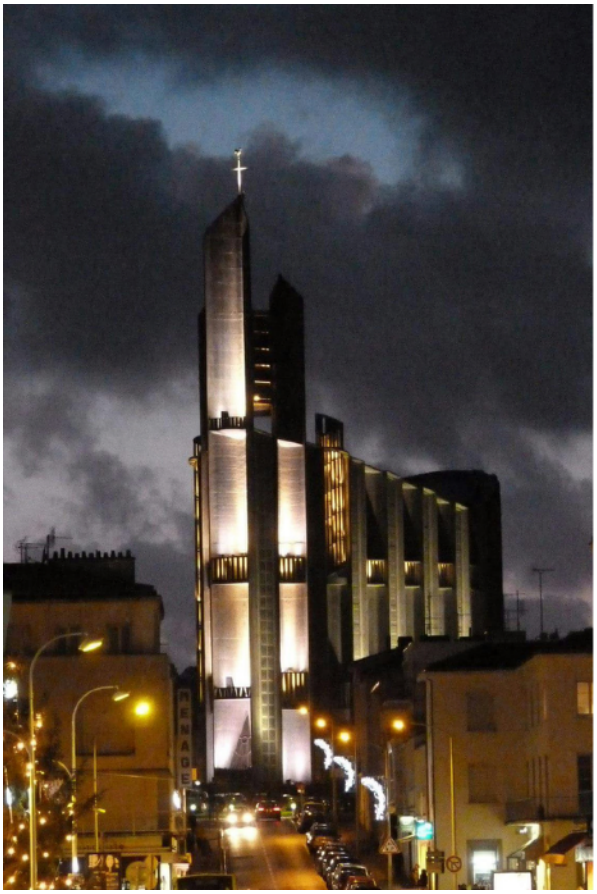

Au sujet de la mise en lumière nocturne de l'église : le système de boîtier d'éclairage festif livré ne permettrait pas une utilisation de plus de quelques jours pour une animation. Compatibilité entre boîtiers neufs et existants ? Surcoût !
En fixe, l'éclairage actuel nocturne de couleur parme est sujette à critique du public. Les couleurs liturgiques sont: le violet (parme), le vert et le blanc. Une étude est en cours pour améliorer la polychromie.

Il reste à réaliser les vitraux manquants de part et d'autre du choeur, à rendre plus attractif le tour par les extérieurs de Notre-Dame : parcours paysagé des espaces verts (dont la restauration du square Monseigneur BOUIN), balisage des accès piétons (Est et Ouest),

groupe de visite du 26/04/18 : Photo vue du dessous de la passerelle vers l'entrée principale ouest

Document établi suite visite à la visite des membres du Conseil d'Administration de l'ader avec L CHITTY le 26/04/18 : échange d'informations instructif, avec l'ingénieur en charge du suivi opérationnel de la Ville de Royan, pour nous relater les travaux effectués, et en cours, sur notre cathédrale de béton. Qu'il soit vivement remercié, encore une fois, de sa disponibilité et de la clarté de ses explications, de son obligeance !
